
## Desviación MBD - Informe Nacional de Seguridad

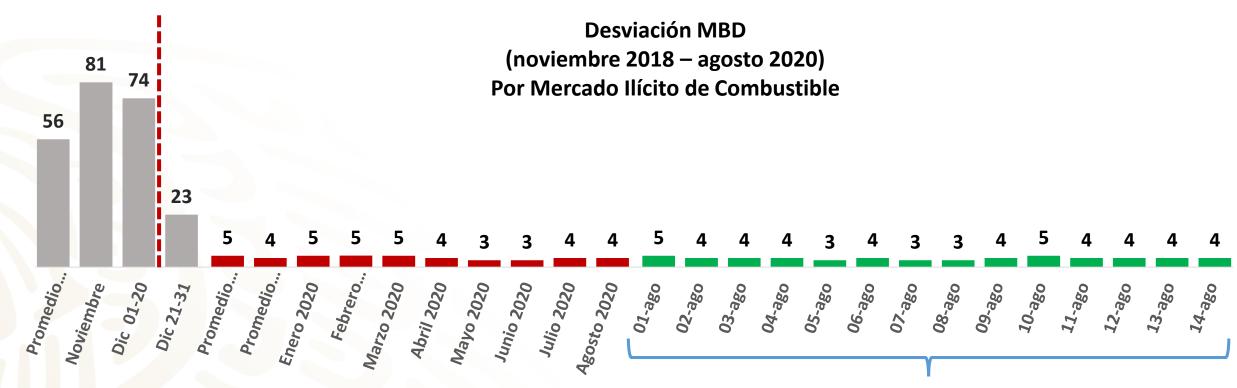

Desvío promedio - 3.9 MBD

El volumen total de empaque del día 14 de agosto fué de 4.0 MB, corresponde al inicio de operación de los Poliductos :
 Salamanca – Guadalajara , Tuxpan – Tula y Cadereyta – Satélite 18" y Rosarito – Mexicali.
 El promedio dia/mes del reporte emitido por el SITRAC, refleja el promedio mensual de la operación diaria en esta gráfica.

Nota 1: Cadereyta - Satélite 18", 08:19 horas inició operación, empacó 0.2 MB. 18:46 horas suspendió por alcanzar el volumen acumulado envio-recibo de -300 bph.

Salamanca – Guadalajara 16", 06:00 horas inició operación, empacó 4.7 MB. 16:55 horas suspendio por TCNH km 77+992, depresionó 3.6 MB.

Tuxpan – Tula, 07:30 horas inició operación, empacó 8.8 MB, 00:03 reducción a 40 MB; 00:09 horas inició recibo Pachuca y se bloqueó Tula; 02:00 suspendió por diferencia de flujos envio-recibo de -183 bph con tendencia a no recuperar balance; se depresionó a Pachuca 3.0 MB y a Tula 4.0 MB

Rosarito – Mexicali, 16:40 horas inició operación, empacó 1.3 MB, 03:00 horas suspendió por operación controlada, depresionó 0.9 MB.

Madero – Cadereyta, 18:11 horas suspendio por TCNH 62+884, depresionó a Madero 1.7 MB y 2.6 MB a Cdereyta.

Estos depresionamientos afectaron el balance del dia dia operativo.
