




Desviación MBD - Informe Nacional de Seguridad

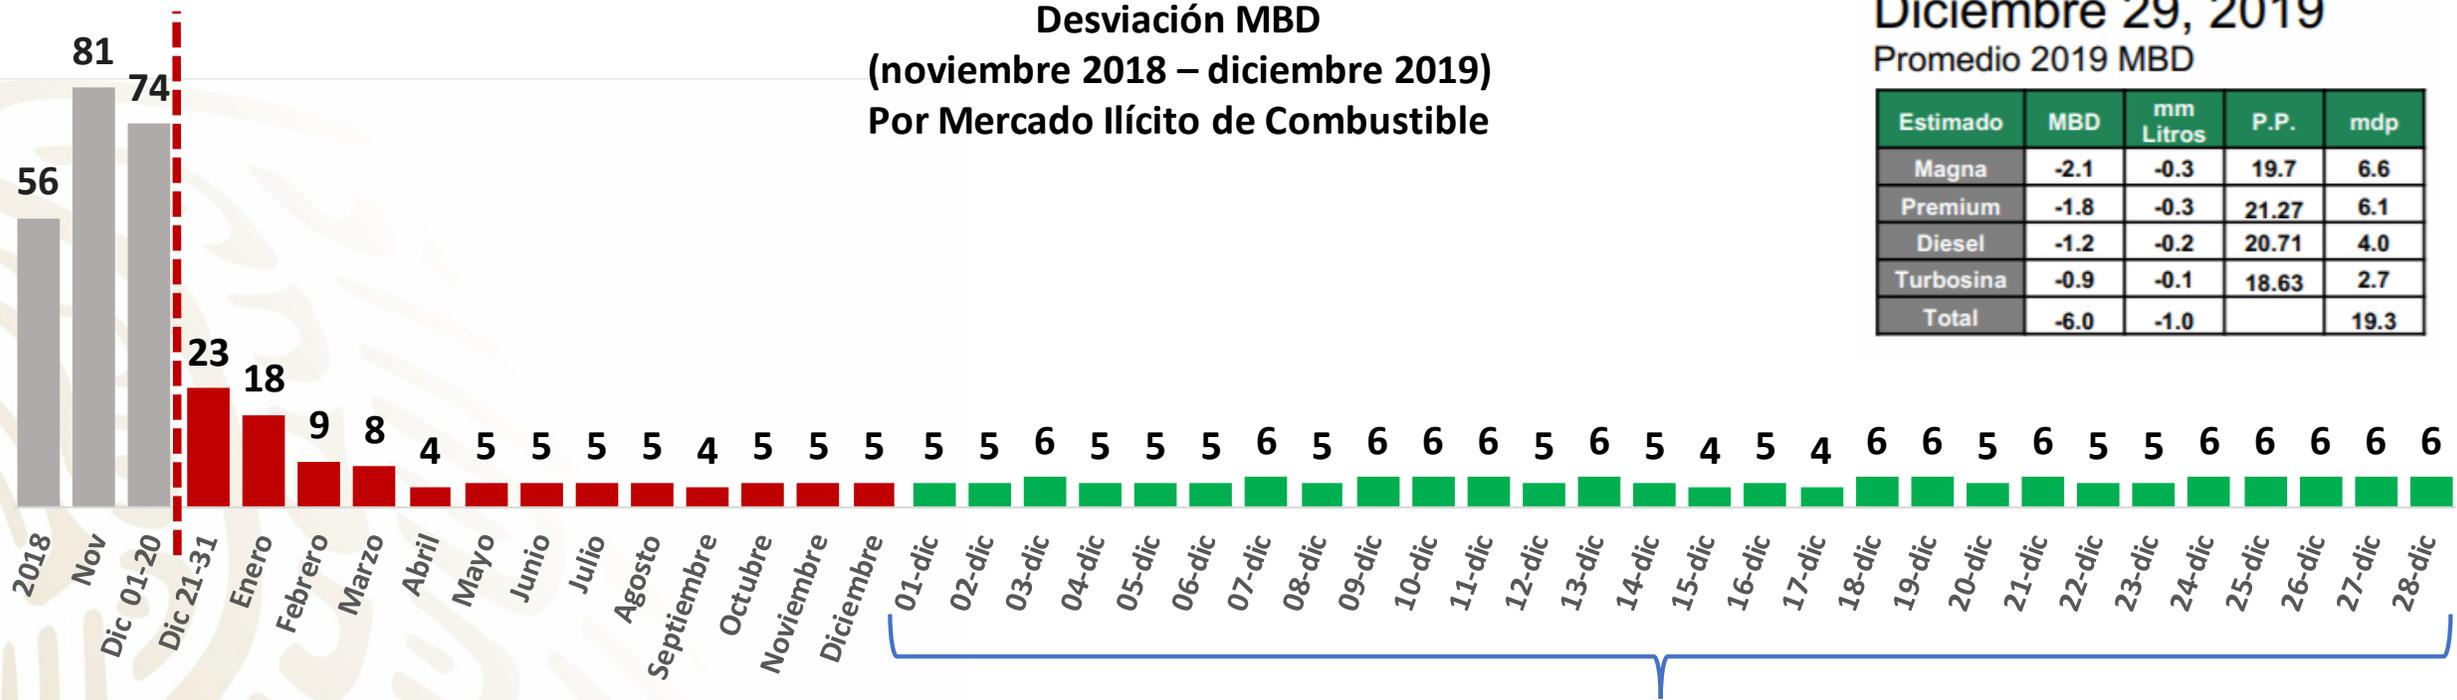

Diciembre 29, 2019
Promedio 2019 MBD

Estimado	MBD	mm Litros	P.P.	mdp
Magna	-2.1	-0.3	19.7	6.6
Premium	-1.8	-0.3	21.27	6.1
Diesel	-1.2	-0.2	20.71	4.0
Turbosina	-0.9	-0.1	18.63	2.7
Total	-6.0	-1.0		19.3

Desvío promedio – **5.4 MBD**

- El volumen total de empaque del día 28 de diciembre fué de 5.5 MB, corresponde al inicio de operación de los Poliductos :
Tuxpan- Tula, Salamanca – Morelia y Monclova – Sabinas.

Nota 1: Salamanca - Morelia, 06:50 horas inició operación, empacó 0.3 MB

Monclova – Sabinas, 08:45 horas inició operación, empacó 0.2 MB.

Tuxpan – Tula, 06:00 horas inició operación, empacó 7.0 MB, 16:53 horas, se reduce a 40 MBD por TCNH en km 223+100, se depresionó hacia Tula 2.0 MB.
Salamanca – Guadalajara, 07:10 horas suspendió por falta de cupo de contaminado en Zapopan, depresionó 0.3 MB; se eliminó TCNH km 42+562; 19:00 horas se presentó caída en la presión estática de Zapopan de 16.7 a 13.7 kg/cm², se depresionó hacia Zapopan 2.0 MB.
 Ambos depresionamientos, afectaron el balance del día operativo.
